

昌吉回族自治州工业和信息化局

“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目

绩 效 评 价 报 告

项目名称：“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目

实施单位：昌吉回族自治州工业和信息化局

委托单位：昌吉回族自治州财政局

评价机构：新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所



目录

摘要	1
一、基本情况	6
(一) 项目概况	6
(二) 项目资金情况	9
(三) 项目绩效目标情况	9
二、绩效评价组织情况	11
(一) 绩效评价目的	11
(二) 绩效评价原则	11
(三) 绩效评价依据	12
(四) 绩效评价工作程序及方法	13
(五) 绩效评价指标体系及标准	18
三、绩效评价综合情况及结论	18
(一) 绩效评价综合结论	18
(二) 绩效目标实现情况	19
四、绩效评价情况分析	19
(一) 项目决策情况	20
(二) 项目管理情况	22
(三) 项目产出情况	25
(四) 项目效益情况	26
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	27
(一) 主要经验及做法	27
(二) 存在的问题	28
六、有关建议	29
(一) 高度重视，加强领导，规范项目程序	29
(二) 根据工作计划和工作内容，进一步完善绩效目标和指标	29
(三) 进一步建立健全预算绩效业务管理制度，强化现场核查	29
(四) 加强培训，提高相关人员工作水平。	29
七、其他需说明的问题	30
(一) 关于评价责任的说明	30
(二) 本次绩效评价的局限性	30
附件：	31

摘要

受昌吉州财政局（以下简称“州财政局”）委托，新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所（以下简称“宏昌”）于2023年7月12日至2023年7月27日对昌吉回族自治州工业和信息化局（以下简称“州工信局”）管理的“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目（以下简称“数字昌吉项目”或“该项目”）资金开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概述

（一）项目背景及目的

昌吉州党委和昌吉州人民政府提出将建设“数字昌吉”作为推进质量变革、效率变革、动力变革，实现高质量发展的重要路径。工业互联网创新作为产业升级换代的核心抓手，昌吉州目前仍然存在关键核心技术缺乏、跨行业构建平台能力不足、标准化体系不完善、制造支撑产业薄弱、工业数据采集和分析能力不足、信息安全领域薄弱环节较多等劣势和短板。因此提高数字化建设是昌吉回族自治州工业互联网发展的有效路径，项目实施对加强昌吉回族自治州辖2个市、5个县的工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态，都有积极的促进作用。

（二）项目实施情况

该项目实施主体为昌吉回族自治州工业和信息化局。2022年12月拨款80万元。

2022年6月通过政府采购的方式进行招标，中标单位新疆中科数智科技有限公司为“数字昌吉”项目编制研究报告。2022年12月报告编制完成，由项目实施单位组织专家对报告进行评审作为验收报告

的依据。截止 2022 年 12 月 31 日，完成编制昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告 1 册。报告完成率达到 100%，报告验收合格率达到 100%。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告 1 册，完成目标 100%。

（三）绩效目标

1. 总目标

编制昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告 1 册，报告完成率 100%，合格率 100%，验收合格率 95%。加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉工业互联网发展生态。提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径。

2. 年度绩效目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

表 3 项目绩效目标与绩效指标实际完成情况表

2022 年年度目标			2022 年年度目标完成情况	
编制昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告≥1 册，报告完成率=100%，报告验收合格率=100%，报告完成及时率=100%。加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉工业互联网发展生态。提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径。			已完成编制昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告≥1 册，报告完成率=100%，报告验收合格率=100%，报告完成及时率=100%。加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉工业互联网发展生态。提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
出指标	数量指标	编制昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告	≥1 册	=1 册

	质量指标	报告完成率	=100%	=100%
	质量指标	报告验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	报告完成及时率	=100%	=95%
	成本指标	报告工作成本	≤72 万元	=69.20 万元
		调研经费	≤8 万元	=2.05 万元
效益指标	社会效益指标	加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态	有效带动	有效带动
	可持续影响指标	提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效路径	持续推动	持续推动
满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度	≥95%	=100%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

通过对“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为 85.95 分，评价等级为“良”。

（二）预算执行情况

“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目，截止 2022 年 12 月 31 日，实际支出 71.25 万元，预算执行率 89.06%，主要用于支付第三方服务费等。

（三）项目绩效情况

截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成昌吉州工业互联网发展路径报告 1 册，完成全部实施任务的 100%。项目实施后，加强昌吉州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态。

三、问题和建议

（一）存在的问题

1. 项目程序不完整

该项目无资金拨付及申请资金的审批文件，程序不完整。

2. 项目绩效指标设置不清晰。

该项目实施单位前期已根据项目内容设置了较明确的绩效目标，绩效目标的设置符合量化的要求，但仍有少部分指标偏定性或难以衡量，有待进一步量化，例如：原时效指标为“报告完成时限”，年度指标设置为“2022 年 12 月 31 日”与时效指标“报告完成及时率”有所重复，指标设置不清晰。

3. 未实施项目绩效监控工作

昌吉州工业和信息化局未按要求在项目实施过程中开展绩效运行监控管理工作。

4. 项目自评表内容与实际情况不相符。

该项目自评表成本指标中实际完成值为 73.52 万元，实际支付为 71.25 万元。

（二）建议和改进措施

1. 高度重视，加强领导，规范项目程序。

建议项目实施单位高度重视，加强领导，项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导，进一步完善项目评价资料，按照项目实施情况规范程序，严格按照自治区关于绩效管理工资档案资料的相关要求，强化力度。

2. 根据工作计划和工作内容，进一步完善绩效目标和指标。

绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应与其项目的实施计划相一致，建议项目实施单位在今后细化绩效目标的过程中，应根据项目的实施内容设置项目的产出目标和效果目标，使目标值与年度任务数或计划数相对应。同时根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化、可衡量。

3. 进一步建立健全预算绩效业务管理制度，强化现场核查

建议项目实施单位建立健全预算绩效管理制度，完善项目的跟踪管理机制，进一步强化资金过程监督，在自治区绩效监控、绩效自评的时间节点开展数据采集、核对、校验和复核工作，确保上报数据准确，同时要对项目资金执行情况进行定期的现场核查。通过定期检查，及时掌握资金执行金额、实施效果，为预算调整、管理优化、政策调整等提供决策依据。

4. 加强培训，提高相关人员工作水平。

建议项目实施单位采取多种培训形式对财务人员、业务人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利展开提供保障。



昌吉回族自治州工业和信息化局 “数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目

绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受昌吉州财政局的委托，新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了昌吉回族自治州工业和信息化局（以下简称“州工信局”）管理的“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目（以下简称“数字昌吉”或“该项目”）的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项的背景及目的

国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外

电话：0994-2340071 传真：0994-2347950



贸易形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，各企业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。企业发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》，“互联网+”“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

党中央、国务院高度重视工业互联网发展。习近平总书记多次作出重要指示，要求加快 5G、工业互联网等新型基础设施建设，强调 5G 与工业互联网的融合将加速数字中国、智慧社会建设，加速中国新型工业化进程，为中国经济发展注入新动能。《国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出构建基于 5G 的应用场景和产业生态，积极稳妥发展工业互联网。

工业和信息化部深入实施“5G+工业互联网”512 工程，协同工业企业、信息通信企业、高校、科研院所等产业各方打好“团体赛”，推动“5G+工业互联网”在制造强国和网络强国建设、经济高质量发展进程中发挥重要作用。



昌吉州党委和昌吉州人民政府提出将建设“数字昌吉”作为推进质量变革、效率变革、动力变革实现高质量发展的重要路径。工业互联网创新作为产业升级换代的核心抓手，昌吉州目前仍然存在关键核心技术缺乏、跨行业构建平台能力不足、标准化体系不完善、制造支撑产业薄弱、工业数据采集和分析能力不足、信息安全领域薄弱环节较多等劣势和短板。因此科学谋划是昌吉回族自治州工业互联网发展的有效路径，对加强昌吉回族自治州辖 2 个市、5 个县的工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态，都有积极的促进作用。

2. 项目实施主体

该项目实施主体为昌吉回族自治州工业和信息化局。单位主要职责：（1）贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出昌吉州新型工业化、信息化发展战略和建议；制定昌吉州经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展；（2）制定昌吉州经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实国家、自治区产业政策，制定昌吉州工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划。

3. 项目主要内容

编制“数字昌吉”可行性研究报告。该项目主要围绕“5G+工业互联网”、“工业互联网平台体系”、“工业互联网安全”、“工业互联网数据中心建设”、“工业互联网产业生态”和“工业互联网在各行



业的应用及拓展”等重点领域开展摸底调查和路径分析研究，提成昌吉州未来 3-5 年分阶段实施的重点任务。

4. 项目实施情况

该项目实施主体为昌吉回族自治州工业和信息化局。2022 年 12 月拨款 80 万元。

2022 年 6 月通过政府采购的方式进行招标，中标单位新疆中科数智科技有限公司为“数字昌吉”项目编制研究报告。2022 年 12 月报告编制完成，由项目实施单位组织专家对报告进行评审作为验收报告的依据。

截止 2022 年 12 月 31 日，实际支出 71.25 万元，完成编制昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告 1 册。报告完成率达到 100%，报告验收合格率达到 100%。

（二）项目资金情况

1. 预算情况

该项目实施期为 2022 年 1 月-2022 年 12 月，预算总投资 80.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际到位资金 80.00 万元，资金到位率为 100%。

2. 预算执行情况

该项目 2022 年实际支出资金 71.25 万元，预算资金执行率为 89.06%。详细资金支出明细见附件 2：“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目资金支付明细表。

（三）项目绩效目标情况



根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

总体目标		年度目标		
编制昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告1册。		完成编制昌吉州工业互联网发展路径分析报告1册。		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	说明
产出指标	数量指标	编制昌吉州工业互联网发展路径分	≥1册	完成编制研究报告大于等于1册
	质量指标	报告完成率	=100%	报告完成率达到100%
	质量指标	报告验收合格率	=100%	报告验收合格率达到100%
	时效指标	报告完成及时率	=100%	报告完成及时率达到100%
	成本指标	报告工作成本	≤72万元	项目年度投资总成本不超过72万元
		调研经费	≤8万元	项目调研经费不超过8万元
效益指标	社会效益指标	加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态。	有效带动	项目完成后是否可以加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态



效益指标	可持续影响指标	提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径	持续推动	是否未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径
满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度	≥90%	报告使用人满意度大于等于90%

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，对“数字昌吉”项目从决策、管理和绩效三个方面进行客观、公正的综合评价，形成评价结论。

通过开展绩效评价，了解“数字昌吉”项目目标设定情况、资金分配、使用及管理情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、资金使用效果和绩效目标完成情况，项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况，收集整理客观真实的基础数据，为“数字昌吉”项目管理提供决策依据。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取相应措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政性资金使用效益。

（二）绩效评价原则

1. 科学公正、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。



2. 经济性、效率性、效益性、公平性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性、公平性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（三）绩效评价依据

1. 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

5. 关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158号）；

6. 关于印发《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕148号）；



7. 关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）；

8. 关于印发《自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（新财预〔2018〕192号）；

9. 昌吉州工业和信息化局提交的绩效自评表；

10. 昌吉州工业和信息化局提交的项目申请、招投标、合同、发票、财政资金支付凭证、验收及内控制度等项目基础资料；

11. 适用于该项目的其他法律法规及规章制度。

（四）绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序

（1）前期准备阶段，包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

（2）成立评价工作组。

（3）开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对项目基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查。在对项目了解的基础上与预算单位主管项目人员及绩效评价指导专家沟通和座谈。最终对初期网络等途径调查的资料进行修正。为编制评价方案奠定基础。

（4）明确项目绩效目标。评价人员根据项目立项、绩效考评办法等相关资料以及经与预算单位主管项目人员充分沟通，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的绩效目标。



(5) 设计绩效评价指标体系。评价人员经与昌吉州财政局和预算单位主管项目人员充分沟通，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(6) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据专项资金相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

(7) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，合理设置各指标权重。

(8) 确定评价范围。根据项目承担单位提供的项目相关资料，进行分类、整理、分析，结合对各种公开数据的汇总、分析，就获取的所有文件资料提出评价意见。

(9) 设计资料清单。根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目承担单位需提交的资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目承担单位配合的事项等。

(10) 制定评价实施方案。我们将项目基本情况、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，经与预算单位、昌吉州财政局相关科室以及绩效评价专家充分交流、共同研究，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。



(11) 评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与预算单位项目主管人员沟通，根据项目承担单位的实际情况，对评价方案、指标体系、资料清单进行多次调整，征求绩效监督指导专家的意见，根据专家意见修改完善后，征求项目主管部门意见，根据反馈意见再次修改完善，报委托方审核同意后实施。

2、组织实施：包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

(1) 下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目预算单位提供的资料等，通过业务主管部门通知项目预算单位。

(2) 资料收集与核查。评价人员对项目预算单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开数据资料与项目预算单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

(3) 非现场评价。对各项目预算单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并收取问卷调查。通过对被调查对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量适中，基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

(4) 现场评价。组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价，主要包括。



a 听取情况介绍。听取项目预算单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

b 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c 资料核查。根据项目预算单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果通过查阅相关资料等手段，对项目预算单位数据进行检查。采集评价数据、资料以及证明材料经被评价单位加盖公章后，记入评价工作底稿。

d 分析评价。以项目预算单位现场收集资料形成的证明材料、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目预算单位的项目决策、管理和绩效等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在问题，进行相关原因分析。

(5) 形成绩效评价结果。对评价情况进行梳理、汇总的基础上形成项目绩效评价结果。评价小组重点的项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价。同时，对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解和掌握项目实施进度，了解申报资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。



3、综合分析及评价报告撰写：包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

(1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。全面阐述评价项目的基本情况,明确项目绩效目标,在全面分析评价资料的基础上,对绩效目标实现程度,对项目决策、管理、绩效等做出具体分析和评价,对项目绩效与存在问题的分析,力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确,所提建议具有针对性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后,评价小组与预算单位进行沟通,征询其意见,此并非预算单位干涉工作组的职业判断,而是从预算单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后起草绩效评价报告初稿,上报委托单位。

(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见,对评价报告进行修改完善。在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿,含摘要,提交委托方。

4. 评价方法

正确的评价方法是评价评价工作顺利开展保障,在实际项目结合经验的情况下,评价小组采取的方法包括但不限于:比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下:

在指标分析环节:总体采用比较法,同时辅以公众评判法。定量指标分析环节:主要采用对比指标预期指标值和指标截止评价日的完成情况,综合分析绩效目标实现程度;定性指标分析环节,主



要采用问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

（五）绩效评价指标体系及标准

通过对该项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部、自治区财政厅以及昌吉州财政局相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见报告附件 1。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过对“数字昌吉”项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为 85.95 分，评价等级为“良”。各部分权重和绩效分值如下表所示：



表 2 项目评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	10.5	70.00%
项目管理	25	19.45	77.80%
项目产出	30	26	86.67%
项目效益	30	30	100.00%
合计	100	85.95	85.95%

(二) 绩效目标实现情况

通过对重新梳理后设置的绩效目标、指标及预期指标值进行评价打分。“数字昌吉”项目的绩效目标与绩效指标实际完成情况列表如下：

表 3 项目绩效目标与绩效指标实际完成情况表

2022 年年度目标			2022 年年度目标完成情况	
编制昌吉州工业互联网发展路径分析报告≥1 册，报告完成率=100%，报告验收合格率=100%，报告完成及时率=100%。加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉工业互联网发展生态。提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径。			已完成编制昌吉州工业互联网发展路径分析报告≥1 册，报告完成率=100%，报告验收合格率=100%，报告完成及时率=100%。加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉工业互联网发展生态。提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
出指标	数量指标	编制昌吉州工业互联网发展路径分析报告	≥1 册	=1 册
	质量指标	报告完成率	=100%	=100%
	质量指标	报告验收合格率	=100%	=100%



	时效指标	报告完成及时率	=100%	=95%
	成本指标	报告工作成本	≤72 万元	=69.20 万元
		调研经费	≤8 万元	=2.05 万元
效益指标	社会效益指标	加强自治州工业互联网平台能力建设, 加快构建昌吉州工业互联网发展生态	有效带动	有效带动
	可持续影响指标	提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效路径	持续推动	持续推动
满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度	≥95%	=100%

四、绩效评价情况分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况, 指标分值 15 分, 评价得分 10.5 分, 得分率为 70.00%。

表 4 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	2	0	0.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2	66.67%



一级指标	二级指标	三级指标	权重（%）	得分	得分率
		绩效指标明确性	2	1.5	75.00%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100.00%
		资金分配合理性	2	1	50.00%
小计			15	10.5	70.00%

1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 3 分，得分率为 60.00%。

(1) 立项依据充分性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划及相关事业发展政策，项目实施内容与预算单位部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目支出符合公共财政要求和财政供给范围，项目已取得昌吉州农业农村局及昌吉州财政局的批复，立项依据比较充分。

(2) 立项程序规范性

指标分值 2 分，评价得分 0 分。该项目实施未取得相关部门的批复文件，不符合立项程序的规范性。

2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 3.5 分，得分率为 70.00%。

(1) 绩效目标合理性



指标分值 3 分，评价得分 2 分。项目预算单位按照自治区、呼图壁县财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，时效指标“报告完成及时率”“报告完成时限”指标有所重复，设置不合理。

(2) 绩效指标明确性

指标分值 2 分，评价得 1.5 分。项目预算单位在设定绩效指标时，大部分指标都明确清晰、可衡量。但仍有少部分指标设置不明确或难以衡量，有待进一步量化，例如：原可持续影响指标为“提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径”，预期指标值为持续推动，指标设置不明确，本年度难以衡量指标值是否达成。

3. 资金投入

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。

(1) 预算编制科学性

指标分值 3 分，评价得分 3 分。该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。

(2) 资金分配合理性

指标分值 2 分，评价得分 1 分。该项目资金分配在实施方案中确定，实际实施中未按照确定的自己分配执行且难以执行。

(二) 项目管理情况



项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 25 分，评价得分 19.45 分，得分率为 77.8%。

表 5 项目管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
项目管理	资金管理	资金到位率	4	4	100.00%
		年度预算执行率	5	4.45	89.00%
		资金使用合规性	4	2	50.00%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%
		制度执行有效性	4	4	100.00%
		绩效监控有效性	2	0	0.00%
		自评报告规范性与整改 反馈及时性	2	1	50.00%
小计			25	19.45	77.80%

1. 资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 13 分，评价得分 10.45 分，得分率为 80.38%。

(1) 资金到位率

“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目 2022 年度预算资金 80 万元，实际到位 80 万元，资金到位率为 100%。指标分值 4 分，根据评分标准该指标评价得分 4 分。

(2) 年度预算执行率



截止 2022 年 12 月 31 日，“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目实际支出资金总额为 71.25 万元，预算资金执行率为 89.06%。指标分值 5 分，根据评分标准该指标评价得分 4.45 分。

(3) 资金使用合规性

指标分值 4 分，评价得分 2 分。通过查看预算单位财务资料，该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的开支范围，财政直接支付凭证金额与审核金额和发票金额一致。支付无整的审批程序和手续。

2. 组织实施

该指标涉及 4 个三级指标，分值 12 分，评价得分 9 分，得分率为 75%。

(1) 管理制度健全性

指标分值 4 分，评价得分 4 分。预算单位沿用昌吉州工业和信息化局的各项内控制度，具有相应的财务和项目管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

指标分值 4 分，评价得分 4 分。该项目在项目建设领导小组的统筹协调下，严格执行本单位的各项项目和财务管理制度以及国家相关法律法规。相关人员、设备落实到位，资料齐全并归档及时。

(3) 绩效监控有效性

指标分值 2 分，评价得分 0 分。昌吉州工业和信息化局未按要求在项目执行过程中开展绩效运行监控管理工作。



(4) 自评报告规范性与整改反馈及时性

指标分值 2 分，评价得分 1 分。预算单位按照财政部门及预算资金使用要求自评表成本与实际支出不符。

(三) 项目产出情况

项目产出指标从项目实施后的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目实施后的产出情况，指标分值 30 分，评价得分 26 分，得分率为 86.67%。

表 6 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率 (%)
项目产出	产出数量	完成昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告	6	6	100.00%
	产出质量	报告验收合格率	6	6	100.00%
	产出时效	报告完成及时率	6	6	100.00%
	产出成本	工作成本	6	4	66.67%
		调研经费	6	4	66.67%
小计			30	26	86.67%

1. 产出数量

该指标涉及 1 个三级指标，分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%，该项目完成昌吉州工业互联网发展路径分析研究报告 1 册，完成目标 100%。

2. 产出质量

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分。项目报告验收合格率 $\geq 100\%$ ，成率为 100%，完成设定绩效指标。



3. 产出时效

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。该项目报告完成及时率 95%，完成时限在 2022 年 12 月 31 日前，完成时效指标。

4. 产出成本

该指标涉及 2 个三级指标，指标分值 12 分，评价得分 8 分，得分率 66.67%。目年度投资总成本 80 万元，实际成本 71.25 万元。实际 89.06%。

（四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益和服务对象满意度两个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

表 7 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率 (%)
项目效益	社会效益	加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态	10	10	100.00%
	可持续影响	提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径	10	10	100.00%
	满意度	报告使用人满意度	10	10	100.00%
小计			30	30	100.00%

1. 社会效益



该指标涉及 1 个三级指标，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷 32 份（其中 32 份问卷答案为有效带动）。指标完成率大于 95%。效益指标完成。

2. 可持续影响指标

该指标涉及 1 个三级指标，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷 32 分。通过“您对《昌吉州工业互联网发展路径研究报告》编制单位技术力量是否满意”、“您认为《昌吉州工业互联网发展路径研究报告》是否具有较好的指导性和操作性？”等问题验证该指标，经调查满意度大于 95%，完成设定绩效指标。

3. 报告使用人数满意度

该指标涉及 1 个三级指标，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。调查问卷结果统计分析，本次共对项目周边受益群众发放并收回调查问卷 32 分。通过“您对《昌吉州工业互联网发展路径研究报告》编制单位技术力量是否满意”、“您认为《昌吉州工业互联网发展路径研究报告》是否具有较好的指导性和操作性？”等问题验证该指标，经调查满意度大于 95%，完成设定绩效指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 合理规划，全面实施。



项目实施单位根据项目实施方向、内容和要求，结合绩效目标，开展科学合理的规划设计，并按规划设计全面推进实施，并严格控制项目质量。

2. 强化监督，健全工作机制，确保建设质量。

项目实施单位为加强项目建设的质量管理，提高项目成效，规范资金使用，形成激励机制，为了保障战略目标的顺利实现，组成了项目建设的督查组，开展“事前、事中、时候”工作督促指导，确保了项目建设的规范、有序、稳步、快速地推进

（二）存在的问题

1. 项目程序不完整

该项目无资金拨付及申请资金的审批文件，程序不完整。

2. 项目绩效指标设置不清晰。

该项目实施单位前期已根据项目内容设置了较明确的绩效目标，绩效目标的设置符合量化的要求，但仍有少部分指标偏定性或难以衡量，有待进一步量化，例如：原时效指标为“报告完成时限”，年度指标设置为“2022 年 12 月 31 日”与时效指标“报告完成及时率”有所重复，指标设置不清晰。

3. 未实施项目绩效监控工作

昌吉州工业和信息化局未按要求在项目实施过程中开展绩效运行监控管理工作。

4. 项目自评表内容与实际情况不相符。



该项目自评表成本指标中实际完成值为 73.52 万元，实际支付为 71.25 万元。

六、有关建议

1. 高度重视，加强领导，规范项目程序。

建议项目实施单位高度重视，加强领导，项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导，进一步完善项目评价资料，按照项目实施情况规范程序，严格按照自治区关于绩效管理工资档案资料的相关要求，强化力度。

2. 根据工作计划和工作内容，进一步完善绩效目标和指标。

绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应与其项目的实施计划相一致，建议项目实施单位在今后细化绩效目标的过程中，应根据项目的实施内容设置项目的产出目标和效果目标，使目标值与年度任务数或计划数相对应。同时根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化、可衡量。

3. 进一步建立健全预算绩效业务管理制度，强化现场核查

建议项目实施单位建立健全预算绩效管理制度，完善项目的跟踪管理机制，进一步强化资金过程监督，在自治区绩效监控、绩效自评的时间节点开展数据采集、核对、校验和复核工作，确保上报数据准确，同时要对项目资金执行情况进行定期的现场核查。通过定期检查，及时掌握资金执行金额、实施效果，为预算调整、管理优化、政策调整等提供决策依据。

4. 加强培训，提高相关人员工作水平。



建议项目实施单位采取多种培训形式对财务人员、业务人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利展开提供保障。

七、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 昌吉州工业和信息化局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在财政部门 and 预算单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 本所与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

附件：



1. 项目绩效评价指标体系及评分表
2. 项目资金支付明细表
3. 问卷调查分析报告
4. 相关负责人访谈

新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所

2023年7月27日



附件1:

“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标					指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	权重(%)					
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项是否符合行业及发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	3	100.00%	
				立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策(0.5分)。	0	0.00%	无审批文件
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平(0.5分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。	2	66.67%	时效指标为“报告完成及时率”“报告完成时限”指标有所重复
				绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	1.5	75.00%	部分指标偏定性或难以衡量
		资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。	3	100.00%	
				资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分(1分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。	1	50.00%	
资金管理	13	资金到位率	4	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 ①资金到位率为100%,得满分;②资金到位率在80%-100%之间的,每降低1%扣除对应分值5%的权重分;③资金到位率低于80%,得0分。	4	100.00%	
				年度预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 该指标得分=预算执行率×指标权重	4.45	89.00%	71.25/80*5=4.45
		资金使用合规性	4	资金使用是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算资金拨付、使用的规范性、合法性。	4	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	2	50.00%	无资金批复文件

“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标					指标解释	评分标准	得分	得分率	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重(%)					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	权重(%)					
项目管理	25	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	4	100.00%	未依据本建设项目的功能特性就制定本项目建设制定专门的内控管理措施
					项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。	4	100.00%	
			绩效监控有效性	2	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理,是否根据绩效监控结果采取了调整和改进措施。	①是否定期对项目实施继续运行监控管理(0.5分); ②是否定期归集相关监控数据、资料(0.5分); ③是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施(1分)。		0.00%	未按要求在项目执行过程中开展绩效运行监控管理工作
					是否按财政部门要求开展项目支出绩效自评并针对报告中存在的问题进行整改反馈。	①是否及时开展了绩效自评(1分); ②绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全(0.5分); ③针对存在的问题及时进行了整改反馈(0.5分)。	1	50.00%	自评表成本与实际支出不符
项目产出	30	产出数量	完成昌吉州工业互联网发展路径分析报告	6	项目实际产出数量是否达到预期设定绩效指标。	产出数量指标完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100% 评分标准: ①完成率为100%及以上的,得满分;②完成率在60%-100%之间的,每降低1%扣除对应分值的权重分;③完成率低于60%的,得0分。	6	100.00%	
					报告验收合格率	按照计划完成的,得满分,未按照计划完成的,得0分	6	100.00%	
					报告完成及时率	项目项目按计划完成的,得满分;未按时支付的,得0分	6	200.00%	
		产出成本	工作成本	6	项目成本是否控制在预定成本范围内	①项目实际成本符合预期设定的成本指标的,得满分; ②项目实际成本存在调整预算情况,调整原因合理,项目实施过程中采取了一定的成本控制措施的,得2-4分; ③项目实际成本与设定成本指标偏差较大的,得0-2分。	4	66.67%	存在有略微偏差
					调研经费	成本控制率=(实际成本/计划完成数量成本)×100%。 评分标准: ①控制率为100%的,得满分;②控制率在60%-100%之间的,每降低1%扣除对应分值的权重分。③控制率低于60%的,得0分。	4	66.67%	存在有略微偏差
					加强自治州工业互联网平台能力建设,加快构建昌吉州工业互联网发展生态	指标完成率=Σ样本数(“是”×1)/总样本数×100%,分值95%以上,得满分;低于95%,每下降1%,扣权重3%分值;扣完为止。	10	100.00%	
项目效益	30	社会效益	提出未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径	10	是否未来三到五年昌吉州工业互联网发展的有效途径	指标完成率=Σ样本数(“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3)/总样本数×100%,分值95%以上,得满分;低于95%,每下降1%,扣权重3%分值;扣完为止。	10	100.00%	
					报告使用人满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	100.00%	

附件 3：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理，引入“加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态”、“报告使用人满意度”等效益指标，了解群众对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

1. 调研对象

本次调研的受益对象为报告使用人。

2. 调研内容

对呼“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目实施后的满意度，包括对项目的了解情况、该项目实施否能够加快构建昌吉州工业互联网发展生态等多方面进行调查。

3. 调研方法


问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

4. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，以报告使用人为对象随机抽取 32 人为样本，发放问卷 32 份。

5. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调研在昌吉州工信局的协调配合下，组织安排线上问卷的发放与回收，通过下方二维码进行问卷调查。

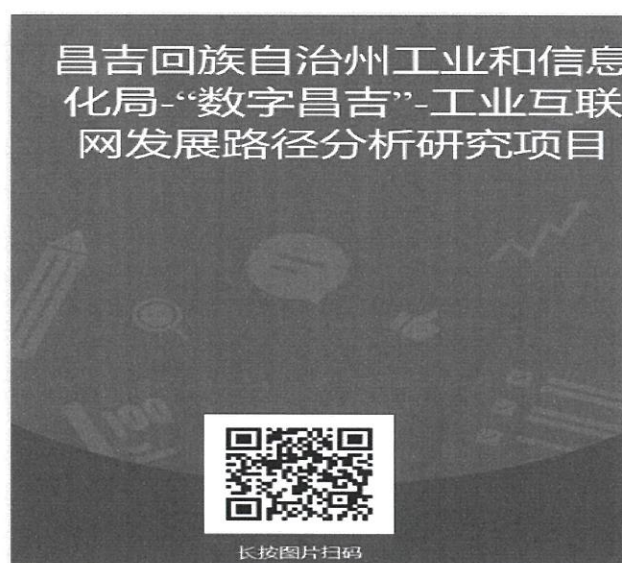

6. 问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价小组实际发放问卷 32 份，回收问卷 32 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 32 份，有效回收率 100%，本次调研的整体情况如下：

第 1 题 您对《昌吉州工业互联网发展路径研究报告》编制情况进度是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	26	81.25%
比较满意	6	18.75%
一般	0	0%
本题有效填写人次	32	

第 2 题 您对《昌吉州工业互联网发展路径研究报告》编制单位工作质量是否满意？
[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	26	81.25%
比较满意	5	15.63%
一般	1	3.13%
本题有效填写人次	32	

第 3 题 您对《昌吉州工业互联网发展路径研究报告》编制单位技术力量是否满意？
[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	24	75%
比较满意	8	25%
一般	0	0%
本题有效填写人次	32	

第 4 题 您认为《昌吉州工业互联网发展路径研究报告》是否具有较好的指导性和操作性？
[单选题]

选项	小计	比例
具有很好的指导性和操作性	19	59.38%

具有较好的指导性和操作性	12	37.5%
具有一般的指导性和操作性	1	3.13%
本题有效填写人次	32	

第 5 题 您认为《昌吉州工业互联网发展路径研究报告》是否能够加快构建昌吉州工业互联网发展生态。 [单选题]

选项	小计	比例
有效带动	32	100%
无效带动	0	0%
本题有效填写人次	32	

第 6 题 单位名称： 办公室联系电话： [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

序号	答案文本	
1	昌吉移动	16 华电新疆准东五彩湾发电有限公司
2	昌吉州电信	17 新疆东方希望有色金属有限公司
3	昌吉移动	18 西域春
4	昌吉州电信公司	19 王玉刚
5	新疆奥贝特工业设备有限公司	20 木垒昌盛日电太阳能科技有限公司
6	昌吉联通	21 张志宏
7	吉木萨尔县立新光电有限公司	22 新疆神火煤电有限公司
8	吉木萨尔县新风新能源有限公司	23 新疆其亚铝电有限公司
9	猛狮光电新能源有限公司	24 新疆其亚铝电有限公司
10	泰顺燃气工程开发有限责任公司	25 新疆华瑞新能源有限公司
11	泰顺燃气工程开发有限责任公司	26 华瑞雀仁光伏一电站
12	新疆千里通交通设施有限公司	27 新疆华荣新能源有限公司
13	呼图壁县锐源通化工有限责任公司	28 木垒县东方民生新能源有限公司
14	王莉莉	29 木垒县东方民生新能源有限公司
15	呼图壁县锐源通化工有限责任公司	30 大唐老君庙风电场
		31 张雨
		32 新疆共创亚通管业有限公司

附件 4： 相关负责人访谈

“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目访谈报告

一、访谈目的

2022 年昌吉回族自治州工业和信息化局在各级领导的大力支持下，实施了林果业加工扶持项目资金项目，项目实施过程中，昌吉回族自治州工业和信息化局不断摸排梳理存在的问题，统筹计划安排，分步骤分阶段进行。项目的实施，加强自治州工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态。

本次绩效评价旨在通过该项目资金的主管单位进行访谈，了解和评估专项资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为提升林果业加工扶持项目资金使用的公平性和合理性建言献策。

二、访谈对象

预算主管单位：昌吉回族自治州工业和信息化局

三、访谈内容

“数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目开展情况及必要性、项目资金保障情况、项目开展取得的成效及执行过程中遇到的主要困难和项目的下一步规划。

四、访谈分析

1. “数字昌吉”-工业互联网发展路径分析研究项目资金项目开展情况及必要性

通过线下访谈了解到，昌吉州党委和昌吉州人民政府提出将建设“数字昌吉”作为推进质量变革、效率变革、动力变革实现高质量发展的重要路径。工业互联网创新作为产业升级换代的核心抓手，昌吉州目前仍然存在关键核心技术缺乏、跨行业构建平台能力不足、标准化体系不完善、制造支撑产业薄弱、工业数据采集和分析能力不足、信息安全领域薄弱环节较多等劣势和短板。因此科学谋划是昌吉回族自治区工业互联网发展的有效路径，对加强昌吉回族自治区辖2个市、5个县的工业互联网平台能力建设，加快构建昌吉州工业互联网发展生态，都有积极的促进作用。

2. 项目资金保障情况

该专项预算自2022年1月起，至2022年12月止。预算单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，是独立核算单位，财务办公室负责预算的组织和实施。主要职责是组织实施已经由昌吉州财政局审议、批准的年度预算；对预算执行过程实行全方位的控制、监督工作；定期向单位领导汇报预算的执行情况。该专项预算是根据单位各项工作发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为确保项目顺利实施的基本支出。

3. 项目开展取得的成效

截止2022年12月31日，实际收到预算资金80，实际支付资金80。本项目资金主要要用于支付第三方服务费等，编制昌吉州工业互联网发展路径报告。

4. 项目执行过程中遇到的主要困难

一是因疫情影响，一些调研工作无法展开，二是对绩效工作认识

不到位，绩效工作重视力度不够。

5. 项目的下一步规划。

一是加强绩效工作业务培训，不断提高业务水平。二是提高重视度，加强与单位领导的沟通联系，增加人员，并派专人学习培训，做好绩效评价工作。三是加大对资金的监控力度，每笔资金的走向都要清楚，合理使用每笔资金，细化资金的收支。





تجارت كىشكىسى

营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91650000766252324B

(副本)

2-1

名称 新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所

注册资本 伍仟万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2004年08月17日

法定代表人 王瑞民

营业期限 2004年08月17日至2024年08月16日

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；基本设施预决（结）算审计验证；法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；提供会计咨询、会计服务；司法会计鉴定；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；绩效管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦13楼A2-A5

登记机关



2020

4月1日

证书序号: 0004048

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称:

首席合伙人: 新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所

主任会计师:

经营场所:

王瑞民

新疆乌鲁木齐市新华北路8号红山新城纪大厦13楼

组织形式:

执业证书编号: 有限责任

批准执业文号: 65010015

批准执业日期:

新财会[2010]5号

2010年02月10日

发证机关:



二〇一〇年二月二十二日
中华人民共和国财政部制

6501050205513
